

# Sprint 1

*"Sprintmål: Opstart og designarbejde"*

*Sprintperiode: 11. februar - 24. februar*

## Projektstatus

	Kommentar	Status
<b>Generelt</b>	En anelse forstyrret start pga. parallelløb med design, men det er lykkedes at få linet arbejde op. Samarbejdet kører som det skal og vi løser problemer som et team allerede.	Grøn
<b>Økonomi</b>	Økonomien er som den skal være, hvis man ser bort fra at vi ikke har lukket point i første sprint. Vi har brugt et par tusind mere end forventet.	Grøn
<b>Tidsplan</b>	Indtil videre er det lykkedes at få linet opgaver op selvom vi kører parallelløb med design og CVI leveringer. Så tidsplanen lader indtil videre til at holde, men vi skal være opmærksomme på vores velocity.	Grøn
<b>Ressourcer</b>	Der er pt. allokeret nok ressourcer til at kunne nå i mål til tiden. Hvis scopet udvides kan vi komme i klemme i slutforløbet, men det tager vi løbende.	Grøn
<b>Scope</b>	Scope er pt. det samme som da vi startede - dog skal vi være opmærksomme på at designarbejdet er estimeret fra hoften før vi gik i gang så det kan ende med at fylde mere end budgetteret.  Generelt er der en lille fare i scopet da vores delopgaver ikke er nedbrudt ret meget, og er derfor i nogle store klumper, der kunne skjule omfang.	Gul
<b>Ricisi</b>	Vi har næsten ikke lukket point i første sprint - dog vil vi på papiret være (markant) foran på point hvis vi får lukket de åbne opgaver hurtigt i sprint 2. Dette udgør en risiko da vores billede af fremgangen ikke er klart.  De øvrige ricisi nævnt i risikologgen virker ikke voldsomme.	Gul
<b>Fejl og Teknisk gæld</b>	Ingen teknisk gæld vi er bekendt med.	Grøn
<b>Samarbejde</b>	Samarbejdet er helt som det skal være. Hele holdet har udtrykt glæde over god kommunikation, hurtig feedback, og generelt er vi godt i sync med hinanden hele tiden.	Grøn

## Værd at bemærke

Efter omstændighederne er første sprint gået rigtig godt. Vi har været udfordret af et asynkront godkendelsesforløb på designet, men teamets samlede indstilling har hjulpet til at vi har fået konstruktivt arbejde fra hånden alligevel. I skrivende stund har vi fået godkendt design i Sverige så nu forventes det, at vi har frie hænder til at køre på med mindre stop-n-go.

Det er derudover vigtigt at bemærke, at vi reelt ikke har lukket mere end 8 point, men der ligger ca. 88 point, der kun "lige" skal rundes af<sup>1</sup>. Hvis vi regner de point med ville vi faktisk have nået markant mere end forventet - det skal dog ikke give falsk tryghed. Som nævnt i overblikket kunne de store opgaver med mange point skjule et ukendt omfang, men det er dog ikke en stor bekymring på nuværende tidspunkt - det giver dog god grund til at være opmærksomme på det potentielle problem.

I forhold til fremdriften generelt forventer vi en mere stødt fremdrift nu holdet i højere grad kan arbejde uafhængigt af eksterne godkendelser.

## Risikolog


Nedenstående viser de risici der er identificeret i projektet. Konsekvens gives i intervallet 1-4 hvor 4 angiver den mest kritiske konsekvens. Sandsynlighed gives i intervallet 1-4, hvor 4 angiver størst sandsynlighed. Samlet score udregnes ved at gange konsekvens med sandsynlighed, og går altså fra 1-16.

Score	Beskrivelse	Sand.	Kons.	Ansv.	Tiltag
8	Parallelløb udvikling, design, og godkendelse af design skaber forsinkelser og/eller ineffektiv tidsforbrug. Som det ser ud nu går det godt, men det er et vigtigt opmærksomhedspunkt.	2 - Lav	4 - Meget høj	Hele Teamet	Vi holder kommunikation en høj og hjælper hinanden med at få opgaverne klar i bedst mulig rækkefølge.
6	Det viser sig undervejs at integrationen til Salesforce er sværere end forventet. Det var en antagelse ved estimeringen at integrationen nemt kunne klares da den eksisterende i forvejen. Det mener vi stadig, men vi kan blive overraskede.	2 - Lav	3 - Høj	Arne, Reload	Vi afklarer hurtigst muligt om integrationen ser problematisk ud.
3	Det opdages undervejs at vi har undervurderet omfanget af arbejdet.	1 - Meget lav	3 - Høj	Nikolas, Reload	Vi sørger for løbende at forholde os til

<sup>1</sup> Af princip vil vi ikke betragte opgaver som færdige før de faktisk er det. Så selvom de er meget tættere på at være færdige end ikke færdige er det ikke point før de er korrekt afsluttet.

					helheden, og udfordrer vores opfattelse af arbejdets omfang.
0 - Ikke indtruffet	Design bliver afvist i Sverige og vi bliver nødt til at lave drastiske ændringer.	1 - Meget lav	2 - Lav	Carina, BoligUdlejerejer	-

## Fremdrift

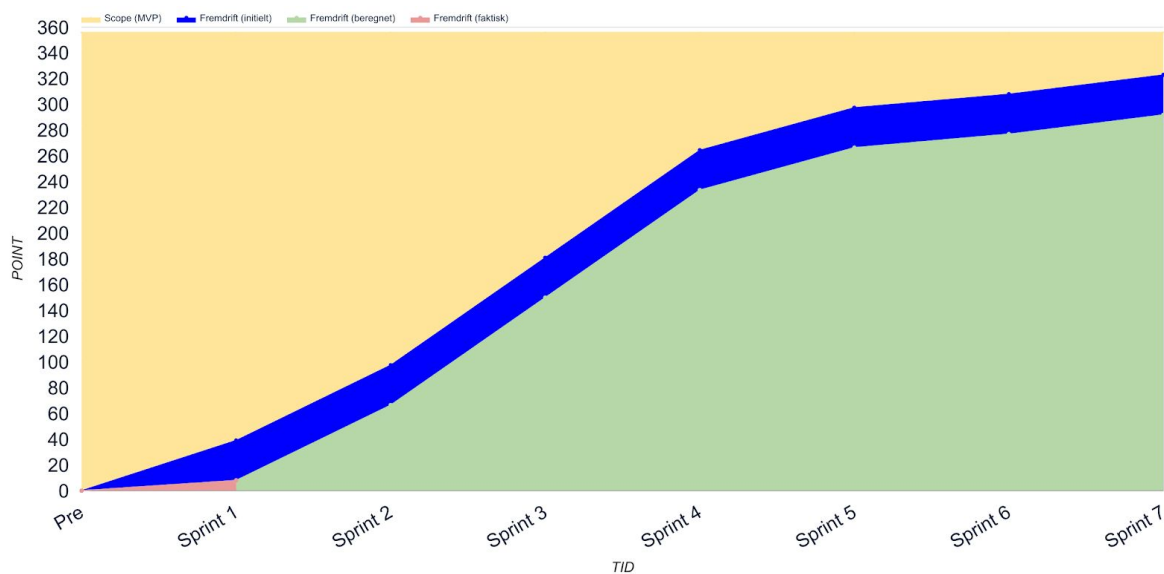

## Sprintet i tal

- Mål for sprint: 61,80 USP
- Afsluttet: 8,00 USP
- Timer, forventet: 103,00 timer
- Timer, faktisk: 99,97 timer
- Velocity, forventet: 0,60 USP/time
- Velocity, faktisk: 0,08 USP/time

## Sprintet i detaljer

### Status Report

\* Issue added to sprint after start time

#### Completed Issues

[View in Issue Navigator](#)

Key	Summary	Issue Type	Priority	Status	Story Points (20 → 8)
	Opsætning til Google Analytics	Story	↓ Undecided	TESTABLE	6
	Sprogversionering	Story	↓ Undecided	RELEASABLE	14 → 2

#### Issues Not Completed

[View in Issue Navigator](#)

Key	Summary	Issue Type	Priority	Status	Story Points (88)
	Grundlæggende tema	Story	↓ Undecided	IN PROGRESS	20
	Opsætning af projekt/installation	Story	↓ Undecided	IN PROGRESS	14
	Håndtering af Cookie	Story	↓ Undecided	ON HOLD	10
	Menu	Story	↓ Undecided	IN PROGRESS	16
	Identificer eksisterende data	Story	↓ Undecided	IN PROGRESS	6
	Opbygge datamodel	Story	↓ Undecided	IN PROGRESS	6
	Søgeside	Story	↓ Undecided	IN PROGRESS	16

#### Issues Removed From Sprint

[View in Issue Navigator](#)

Key	Summary	Issue Type	Priority	Status	Story Points (12)
	(Buffer) Sprogversionering	Story	↓ Undecided	OPEN	12

Se samme rapport [her](#).

## Økonomi

Nedenfor en oversigt over budget vs. brugte og bookede ressourcer.

Sprint	Fra	Til	Timer	DKK (eks. moms)	DKK (inkl. moms)
Pre	01/01/2019	10/02/2019	33,79	38.145,85	47.682,31
Sprint 1	11/02/2019	24/02/2019	99,97	106.095,50	132.619,38
Sprint 2	25/02/2019	10/03/2019	105,00	113.300,00	141.625,00
Sprint 3	11/03/2019	24/03/2019	105,00	111.450,00	139.312,50
Sprint 4	25/03/2019	07/04/2019	105,00	111.450,00	139.312,50
Sprint 5	08/04/2019	14/04/2019	50,00	52.975,00	66.218,75
Sprint 6	15/04/2019	21/04/2019	20,00	18.300,00	22.875,00
Sprint 7	22/04/2019	28/04/2019	50,00	52.975,00	66.218,75
<b>Totalt</b>			<b>568,76</b>	<b>604.691,35</b>	<b>755.864,19</b>
<b>Budget</b>			<b>564,35</b>	<b>600.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Difference</b>			<b>-4,41</b>	<b>-4.691,35</b>	<b>-5.864,19</b>



## Økonomi samlet set

Fra projektets start og frem til 22. februar 2019 er der brugt kr 144.241,35 eks. moms. Dette svarer til ~24,04% af det samlede budget på 600.000,00 eks. moms.
