

# Sprint 4

## "Boligvisning og forside"

Sprintperiode: 25. marts - 7. april

### Projektstatus

	Kommentar	Status
<b>Generelt</b>	Projektet fortsætter med at gå godt, der bliver lagt flot indsats fra hele holdet, der hjælper hinanden med at prioritere og holde flow i opgaverne. Det samlede scope er fortsat stort, men Carina formår løbende at prioritere så vi arbejder på det rigtige og vi er ved at have rundet nogle store vigtige områder af på en god måde så vi er ved at være klar til at gå i luften.	Grøn
<b>Økonomi</b>	Der er fortsat brugt lidt flere timer end oprindeligt planlagt, men der har heldigvis være tilsvarende fremgang. Den allokerede tid til udviklerne i de sidste sprints er justeret for at kompensere for det tidlige arbejde. Fremskrivninger og forventninger for de sidste sprints har været baseret på faktisk budget så der er dog ikke overraskelser gemt der.	Gul
<b>Tid</b>	Med nuværende budget og planlægning holder tidsplanen til at lancere som planlagt.	Grøn
<b>Ressourcer</b>	Der er stadig allokere nok ressourcer og vi har mulighed for at booke mere. Med nuværende budget er der dog ikke behov for at booke mere.	Grøn
<b>Scope</b>	Det samlede scope er kun vokset en anelse under nedbrydning af de sidste designede moduler. Holdet formår fortsat at prioritere løbende og her i den sidste periode bliver det største opmærksomhedspunkt at vi skal begrænse mængden af opgaver vi går i gang med så vi har tid at runde af og lancere. Det resterende scope er gennemgået og prioriteret med Carina så det rammer et godt niveau, der kan lanceres som det er - så det bør ikke skabe problemer.	Gul
<b>Ricisi</b>	Der er ikke større ricisi, men der er tilføjet en enkelt i risikologgen relateret til hostingpartneren i Sverige vi skal være opmærksomme på.	Gul
<b>Fejl og Teknisk gæld</b>	Ingen teknisk gæld vi er bekendt med.	Grøn
<b>Samarbejde</b>	Samarbejdet fortsætter med at brilliere. Ingenting at	Grøn

	udsætte her og det er stadig en fornøjelse hele vejen rundt.	
--	--	--

## Risikolog


Nedenstående viser de risici der er identificeret i projektet. Konsekvens gives i intervallet 1-4 hvor 4 angiver den mest kritiske konsekvens. Sandsynlighed gives i intervallet 1-4, hvor 4 angiver størst sandsynlighed. Samlet score går altså fra 1-16.

Score	Beskrivelse	Sand.	Kons.	Ansv.	Tiltag
!	Det opdages undervejs at vi har undervurderet omfanget af arbejdet.	Indtruffet	3 - Høj	Nikolas, Reload	Det er værd at bemærke at denne risiko - udover at være indtruffet - stadig er aktuel da flere opgaver kan vise sig at være større end forventet.
6	Der opstår problemer/flaskehalse/stop-n-go situationer i forbindelse med hostingpartneren i Sverige, der forsinker eller sluger tid.	2,5 - Mellem	3 - Høj	Arne & Carina	Arne indleder dialog for at afklare tekniske krav ift. Lancering og Carina støtter så vi får hurtige svar.
0 - Ikke indtruffet	Det viser sig undervejs at integrationen til Salesforce er sværere end forventet. Det var en antagelse ved estimeringen at integrationen nemt kunne klares da den eksisterende i forvejen. Det mener vi stadig, men vi kan blive overraskede.	2 - Lav	3 - Høj	Arne, Reload	-
0 - Ikke indtruffet	Design bliver afvist i Sverige og vi bliver nødt til at lave drastiske ændringer.	1 - Meget lav	2 - Lav	Carina, BoligUdlejere	-
0 - Ikke indtruffet	Parallelløb udvikling, design, og godkendelse af design skaber forsinkelser og/eller ineffektiv tidsforbrug.	2 - Lav	4 - Meget høj	Hele teamet	-

## Værd at bemærke

Der er ikke noget at bemærke, der ikke er nævnt i projektstatus.

## Scope

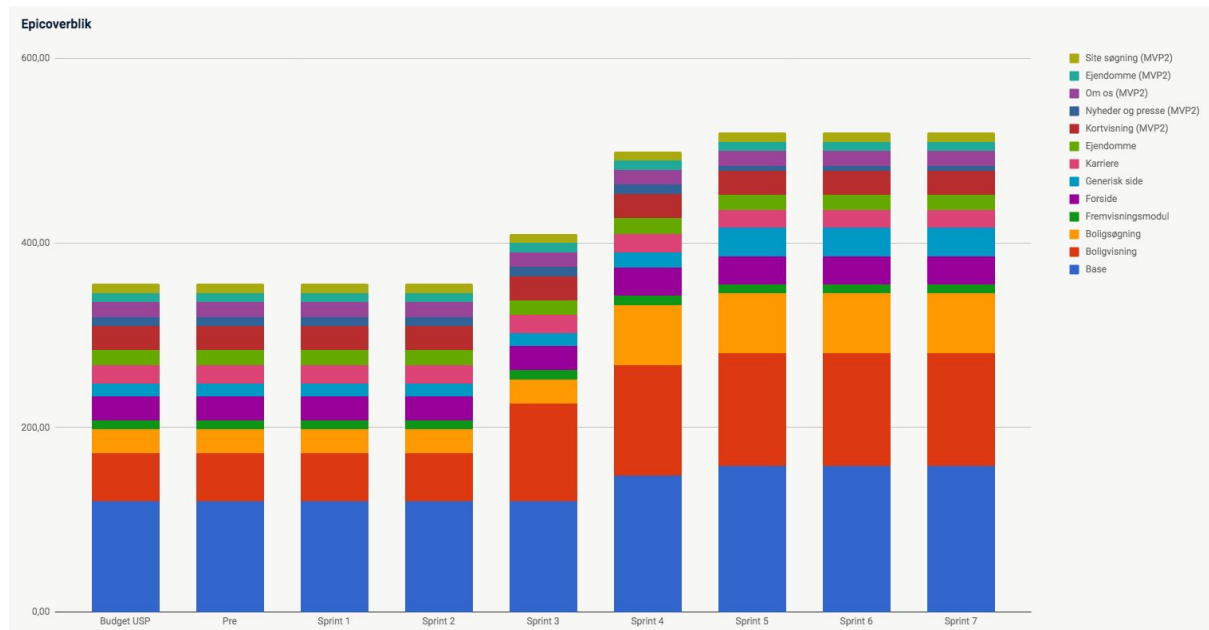

De epics, der har ændret sig mest og hvorfor:


- Generisk side (17 -> 29 point)
  - Vokset efter nedbrydning af individuelle moduler designet af Mads. Nogle moduler er røget i backloggen og de prioriterede opgaver får mange af vores undersider i mål.
- Base (148 -> 158.5 point)
  - Hovedsageligt vokset da vi har lagt en buffer til lancering ind.

Med nuværende budget og fremskrivning af fremgang vil det cirka være følgende opgaver, der ikke vil komme med (i prioriteret rækkefølge fra backloggen):

- Interaktionsdesign (Gennemgang + Afgrænsning + Implementering) (8 point)
- Generisk side: Nyhed/presse/artikel-tag (2 point)
- Nyheder: Liste af nyheder/presse/artikler (5 point)
- Mere margin til checkboxes (1 point)
- Søgside: Luk knap på søge facet tag (0 point)
- Menu redesign (5 point)
- Boligvisning: Filtrering på kort (13 point)
- Fritekstsøgning - Autocomplete (13 point)
- Slidere - skal have tal i siderne, frem for på "handles" (2 point)
- Fremvisningsmodul - AJAX (ingen side-refresh) (3 point)
- Mobil-version af sticky adresse header (0 point)
- Forside: Promo-bokse skal på mobil skjule midterste boks (0 point)

- Tab order på fremvisningsformular i overlay (0 point)
- Boligvisning: Galleri-thumbnails slider i stedet for flere rækker (0 point)
- Timebox: Video-ikon på video-indhold (2 point)
- Generisk side: Citat paragraph (3 point)
- Generisk side: Mulighed for billede (5 point)
- Generisk side: Breaker som paragraph (5 point)
- Kortvisning til søgning (26 point)
- Nybyggeri-side (1 point)
- Generisk side: Firkantet teaser (4 point)
- Boligsøgning: Breaker i to farver (0 point)
- Generisk side: Medie-paragraph (2 point)
- Karriere: Teaser i bunden af jobside (2 point)
- Boligvisning: 3D-model i top-karrusel (8 point)
- Karriere: SoMe-delning på jobside (2 point)
- Forside: Søgning - Redigérbar tekst og billede (5 point)
- Forside: Søgning - Video/pulserende billede som baggrund (5 point)
- Søgning på sitet (10 point)
- Generisk side: Relaterede artikler paragraph (0 point)
- Tilpasning til Boligportal (5 point)
- Ejendomme (16 point)
- Ejendomme (Typer og overblik) (10 point)
- Hvem er vores team (16 point)
- Favorit-funktion (0 point)

## Fremdrift

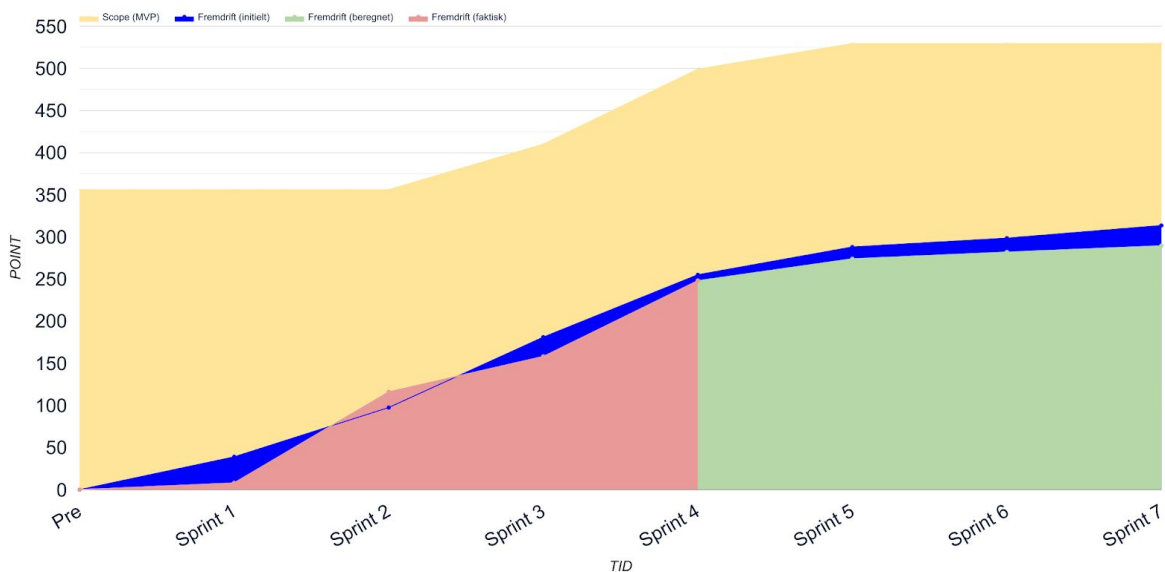

## Sprintet i tal

- Mål for sprint: 57,00 USP
- Afsluttet: 90,00 USP
- Timer, forventet: 95,00 timer
- Timer, faktisk: 116,95 timer
- Velocity, forventet: 0,60 USP/time

- Velocity, faktisk: 0,77 USP/time

## Sprintet i detaljer

### Status Report

• Issue added to sprint after start time

#### Completed Issues

[View in Issue Navigator](#)


Key	Summary	Issue Type	Priority	Status	Story Points (83 → 85)
	Besked når der ikke er nogen resultater på søgning	Story	↓ Undecided	CLOSED	1
	Søgeside: Facetter	Story	↓ Undecided	CLOSED	5
	Søgeside: Sortering	Story	↓ Undecided	CLOSED	1
	Søgeside: Antal resultater	Story	↓ Undecided	CLOSED	2
	Søgeside: Brug min/max værdier fra resultater til sliders	Story	↓ Undecided	CLOSED	0.5
	Boligvisning: Kort (uden filtreringsboks)	Story	↓ Undecided	CLOSED	5
	Boligvisning: Nyttig viden (karrusel)	Story	↓ Undecided	CLOSED	5
	Boligvisning: Testimonial-modul	Story	↓ Undecided	CLOSED	8
	Boligvisning: "Lignende boliger"-karrusel	Story	↓ Undecided	CLOSED	8
	Boligvisning: Karrusel/galleri på top-billede	Story	↓ Undecided	CLOSED	13
	Boligvisning: Plantegninger	Story	↓ Undecided	CLOSED	5
	Boligvisning: Galleri-thumbnails	Story	↓ Undecided	CLOSED	8
	Boligvisning: Timebox til kortfilter	Story	↓ Undecided	CLOSED	2
	Paginerig i URL på søgesiden viser ikke tidligere elementer	Bug	↓ Undecided	CLOSED	2
	Links med underline mangler mellemrum på windows	Bug	↓ Undecided	CLOSED	2
	Forside: Søgning med statisk billede og tekst	Story	↓ Undecided	CLOSED	3
	Forside: Søgning - Dynamisk antal ledige lejemål	Story	↓ Undecided	CLOSED	3
	Forside: Intro-banner (Hardcoded)	Story	↓ Undecided	CLOSED	1
	Forside: Promo-bokse	Story	↓ Undecided	CLOSED	5
	Generisk side: Overskrift og brødtekst, oprettet med Paragraphs	Story	↓ Undecided	CLOSED	3 → 5
	Man kan ikke tjekke checkboxes i bestillingsformularen	Bug	↓ Undecided	CLOSED	0
	Ikonproblemer i IE	Bug	↓ Undecided	CLOSED	0
	Opdater Neue font til at være korrekt + licenseret	Improvement	↓ Undecided	CLOSED	0.5

Se samme rapport [her](#).

## Økonomi

Nedenfor en oversigt over budget vs. brugte og bookedede ressourcer.

Sprint	Fra	Til	Timer	DKK (eks. moms)	DKK (inkl. moms)
Pre	01/01/2019	10/02/2019	33,79	38.145,85	47.682,31
Sprint 1	11/02/2019	24/02/2019	102,05	108.633,10	135.791,38
Sprint 2	25/02/2019	10/03/2019	98,89	106.208,30	132.760,38
Sprint 3	11/03/2019	24/03/2019	132,90	140.454,45	175.568,06
Sprint 4	25/03/2019	07/04/2019	116,95	124.022,40	155.028,00
Sprint 5	08/04/2019	14/04/2019	40,00	42.400,00	53.000,00
Sprint 6	15/04/2019	21/04/2019	15,00	13.725,00	17.156,25
Sprint 7	22/04/2019	28/04/2019	25,00	27.250,00	34.062,50
<b>Totalt</b>			<b>564,58</b>	<b>600.839,10</b>	<b>751.048,88</b>
<b>Budget</b>			<b>563,79</b>	<b>600.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>Difference</b>			<b>-0,79</b>	<b>-839,10</b>	<b>-1.048,88</b>

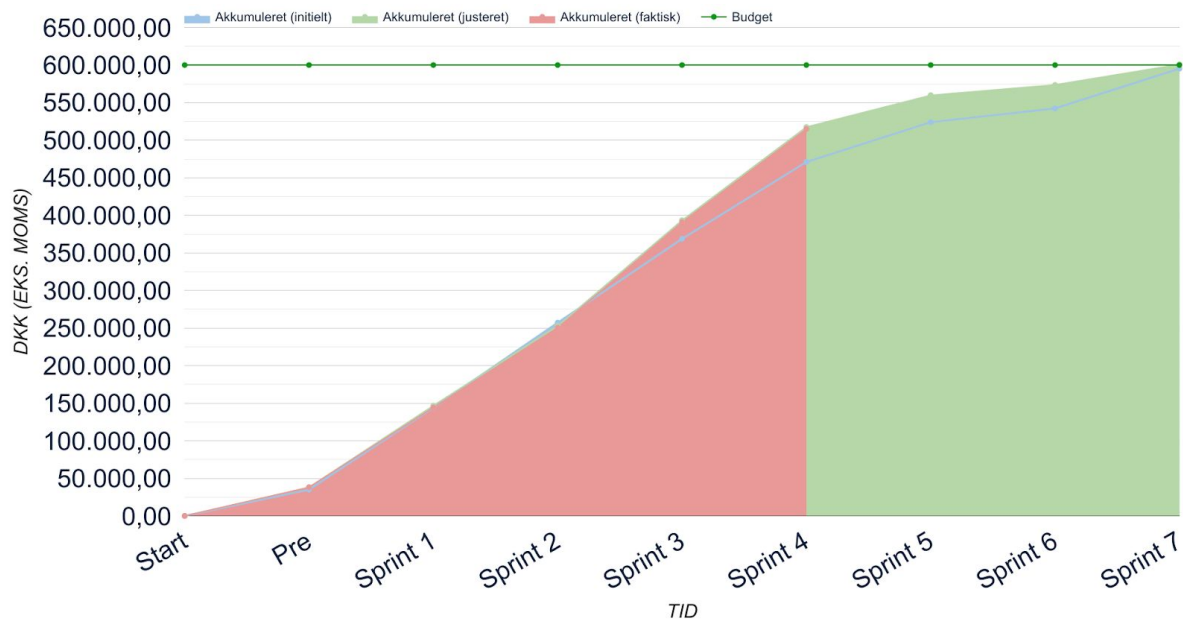

### Økonomi samlet set

Fra projektets start og frem til 9. april 2019 er der brugt kr 514.926,50 eks. moms. Dette svarer til ~85,82% af det samlede budget på 600.000,00 eks. moms.
